



CONSTRUCTION  
INDUSTRY COUNCIL  
建造業議會

# फाल्स सीलिंग इंस्टॉलर इंटरमीडिएट ट्रेड टेस्ट मॉक प्रैक्टिकल टेस्ट पेपर

此文件關於假天花工工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of intermediate trade test False Ceiling Installer.  
Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong  
Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

## अस्वीकरण

इस सामग्री का कोई भी भाग CIC की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से पुनः प्रस्तुत या प्रेषित नहीं किया जा सकता है। इस सामग्री में निहित जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास किए जाने के बावजूद, CIC फिर भी पाठकों को अपने पेशेवर सलाहकारों से उचित स्वतंत्र सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा जहां संभव हो और पाठकों को इस सामग्री को किसी भी प्रासंगिक कार्रवाई करने के लिए पेशेवर सलाह के विकल्प के रूप में नहीं लेना चाहिए।

## पूछताछ

इस सामग्री के बारे में पूछताछ हांगकांग कन्स्ट्रक्शन इन्डस्ट्री ट्रेड टेस्टिड सेन्टर में की जा सकती है:

95, Yue Kwong Road	95, यू क्वांग रोड
Aberdeen	एबरडीन
Hong Kong	हॉग कॉंग

टेलीफोन: (852) 2100 9000

फैक्स: (852) 2100 9090

ईमेल: [enquiry@cic.hk](mailto:enquiry@cic.hk)

वेबसाइट: [www.cic.hk](http://www.cic.hk)

© २०२० कन्स्ट्रक्शन इन्डस्ट्री काउन्सिल

## इंटरमीडिएट ट्रेड टेस्ट पेपर

कार्य का पद: फाल्स सीलिंग इंस्टॉलर


ग्रेड: अर्ध-कुशल श्रमिक

टेस्ट विषय: नामित स्थान पर सीलिंग फ्रेमवर्क इंस्टॉलर के लिए कार्य योजना I और II के अनुसार निम्नलिखित कार्य पूरा करें

1. निर्धारित परीक्षण स्थान पर योजना और इंक लाइनों के अनुसार दीवारों (कार्य योजना I) को सील करने के लिए धातु के ढांचे को स्थापित करें, और जिप्सम बोर्ड को काटें। (60%)
2. धातु फ्रेमवर्क को एसेम्बल और इनस्टॉल करें, और योजना (कार्य योजना II) के अनुसार छत को सील करने के लिए जिप्सम बोर्ड को काटें। (40%)


टेस्ट का समय: 3 घंटे

- नोट्स:
- (1) काम शुरू करने से पहले, अभ्यर्थियों को संलग्न "अभ्यर्थियों के लिए नोट्स" पढ़ना चाहिए।
  - (2) अभ्यर्थी के द्वारा टेस्ट की प्रक्रिया में उचित सुरक्षा उपायों का ध्यान नहीं रखने पर उसे असफल माना जाएगा।
  - (3) टेस्ट पेपर में 4 अंक होते हैं जिसमें 100 अंक पूरा स्कोर और 60 और उससे अधिक अंक उत्तीर्ण होते हैं।

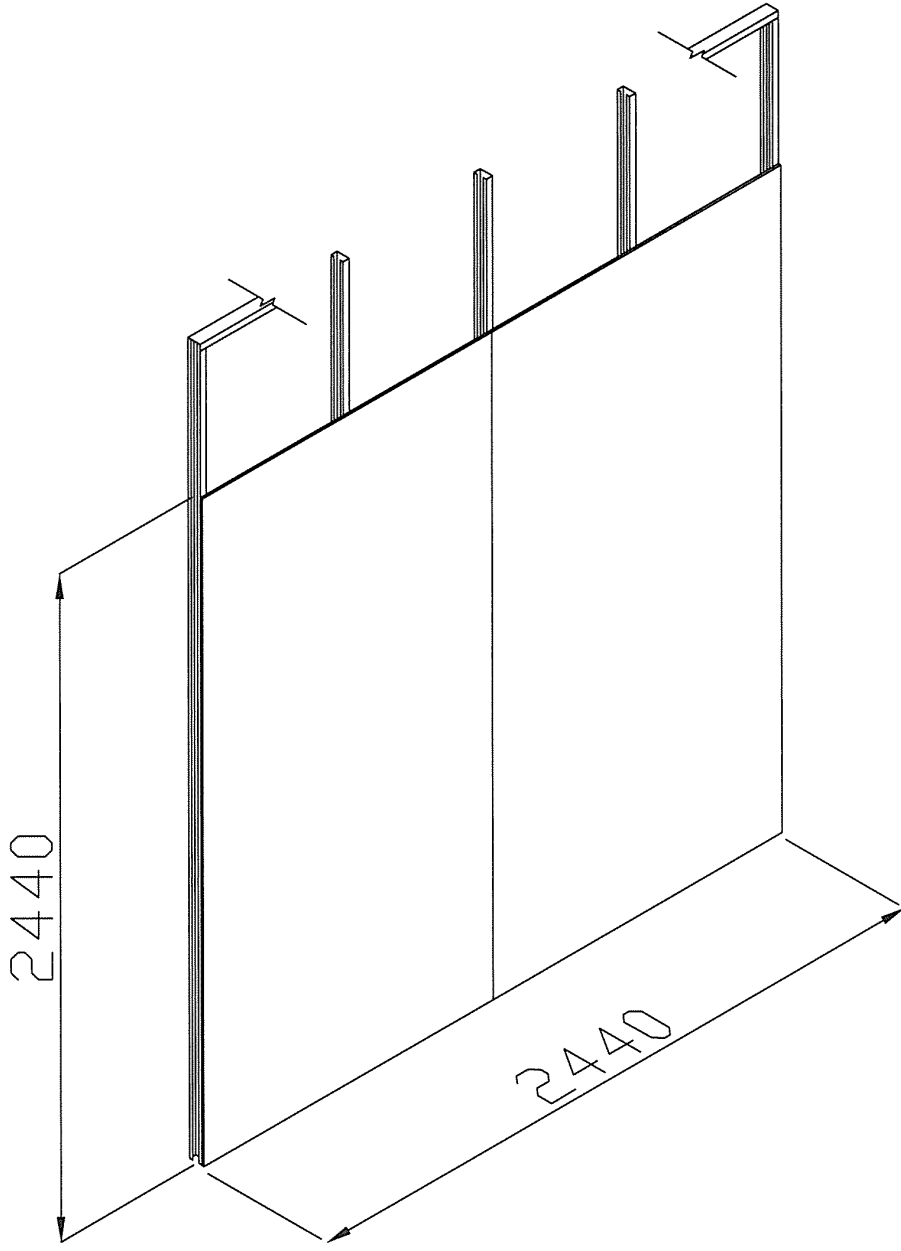

फाल्स सीलिंग श्रमिक (इंटरमीडिएट) कार्य योजना I

सभी माप मिलीमीटर में हैं; यह प्लान वास्तविक अनुपात पर आधारित नहीं है।

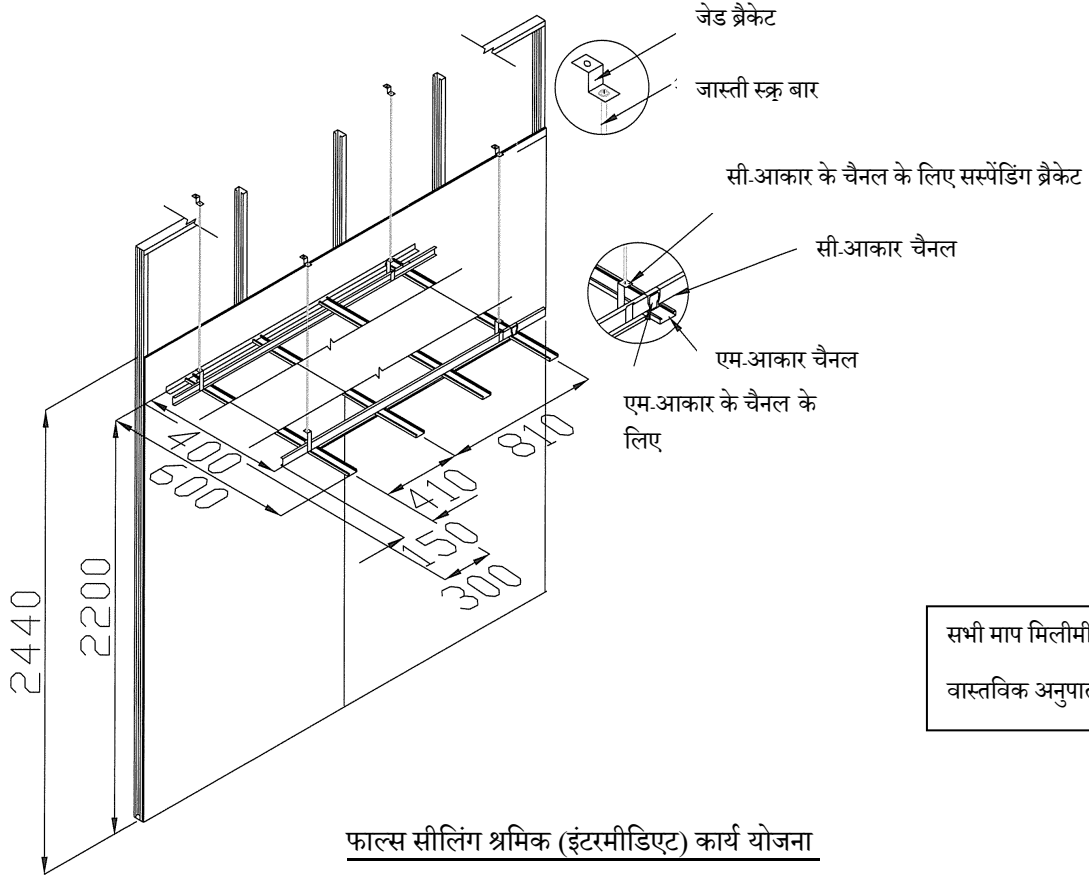

विनिर्देश और तकनीकी आवश्यकताएँ :

1. धातु फ्रेम और क्षैतिज समतल इंक लाइनों के ऊर्ध्वाधर विचलन का सहिष्णुता  $\leq 5$ मिमी (घटक लंबाई के भीतर);
2. धातु ग्रिड सीलिंग योजना माप से मेल खाते हैं, और माप सहिष्णुता;  $\leq 10$  मिमी है;
3. धातु ग्रिड सीलिंग हैंगर संरचना स्थिर है, और जिप्सम बोर्ड के कटे हुए टुकड़े सटीक और चिकने हैं  $\leq 5$ मिमी); जिप्सम बोर्ड अच्छी तरह से बनाए गए हैं और  $\leq 5$  मिमी जोड़ने वाले स्थान के साथ जुड़े हुए हैं;
4. जिप्सम बोर्ड स्क्रू को पर्याप्त मात्रा में सही ढंग से इनस्टॉल करें, और बोर्ड की सतह से बाहर उजागर नहीं करें। पार्टीशन वॉल पैनल के लिए स्क्रू के बीच का स्थान 300 मिमी, और धातु ग्रिड सीलिंग जिप्सम पैनल के लिए 200 मिमी, त्रुटि सहिष्णुता  $\pm 50$  मिमी होनी चाहिए; जिप्सम बोर्ड में प्रवेश करने वाले स्क्रू को जोड़ा जाना चाहिए।

परिक्षार्थी के लिए नोट्स:

1. अभ्यर्थियों को टेस्ट पेपर को ध्यान से पढ़ना चाहिए और किसी भी प्रश्न के लिए अन्वेषक से पूछना चाहिए।
2. अभ्यर्थियों को परीक्षण शुरू होने से पहले, यदि कोई हो, टेस्ट पेपर से जुड़े आरेख और विनिर्देशों का अध्ययन करना चाहिए।
3. अभ्यर्थियों को टेस्ट पेपर, कार्यकारी आरेखण और विनिर्देशों के अनुसार टेस्ट देना चाहिए।
4. अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के सुरक्षा जूते लाने चाहिए, अन्य सुरक्षा उपकरण ट्रेड टेस्टिंग सेंटर द्वारा प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को कार्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए।
5. टेस्ट के लिए आवश्यक सभी उपकरण और सामग्री ट्रेड टेस्टिंग सेंटर द्वारा प्रदान की जाएगी, अभ्यर्थियों को उनकी पर्याप्तता और गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए। अभ्यर्थी ट्रेड कार्य अभ्यास के आधार पर औजारों और सामग्रियों का उचित उपयोग करेंगे। टेस्ट के बाद सभी उपकरणों को ट्रेड टेस्टिंग सेंटर में लौटा दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थी किसी भी समस्या के लिए अन्वेषक से पूछ सकते हैं।
6. अभ्यर्थियों को टेस्ट में उपयोग के लिए उपकरण और सामग्री को संभालने और स्थानांतरित करने और संबंधित कार्यों को करना आवश्यक है।
7. परीक्षक टेस्ट के दौरान समय-समय पर तस्वीरें लेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कैमरा या मोबाइल फ़ोन के साथ कोई भी फ़ोटो या वीडियो लेने की अनुमति नहीं है।
9. आपातकालीन स्थिति के अलावा, अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट के दौरान अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
10. अंकन योजना निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित है:
  - a) आरेख और विनिर्देश की समझ
  - b) टेस्ट शुरू होने से पहले तैयारी
  - c) काम करने की प्रक्रिया
  - d) कार्य की सटीकता और गुणवत्ता
  - e) कार्य की प्रगति
  - f) सामग्री की उचित हैंडलिंग और उपयोग
  - g) यंत्रों और उपकरणों का उचित उपयोग
  - h) सुरक्षा सावधानियां
  - i) अन्य ट्रेड की समझ
  - j) टेस्ट पूरा होने के बाद हाउस कीपिंग
11. समय समाप्त होने पर सभी अभ्यर्थियों को रुकना होगा।
12. अभ्यर्थी को परीक्षण के बाद निरीक्षक को टेस्ट पेपर वापस करना होगा।
13. निरीक्षक को रिश्तत की पेशकश करना कानूनी अपराध है और ट्रेड टेस्टिंग सेंटर ऐसे किसी भी मामले के लिए ICAC को रिपोर्ट करेगा।

यदि अभ्यर्थी किसी भी आवश्यक सुरक्षा सावधानी बरतने और / या किसी भी खतरनाक परिस्थितियों में काम करने में विफल रहता है, उसका मूल्यांकन अनुत्तीर्ण हो जाएगा।
